



TABASCO



<b>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>
<b>CEAS</b>

91

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

#### CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: \_\_\_\_\_

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS231.- CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA, EN LA CIUDAD DE BALANCAN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SF/AL0676/2019      FECHA: 23/04/2019      INV. AUTORIZADA: \$ 2,193,680.80

TOTAL: \$ 2,193,680.80

#### AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

#### AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

#### INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: \_\_\_\_\_

EJERCICIO ACTUAL: \$ 2,152,189.70

INVERSIÓN FINAL: \$ 2,152,189.70

## DATOS DEL CONTRATISTA

**NOMBRE:** PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

**DIRECCIÓN:** CERRADA HICOTEA EDIFICIO 6, DPTO. COLONIA: TABASCO 2000 C.P. 86035  
2, CONJUNTO HABITACIONAL MULTI 80

**LOCALIDAD:** VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

### DATOS DEL CONTRATO

**CONTRATO N°:** CEAS-RAMO23-001/2019 **IMPORTE:** \$ 2,152,190.87 **FECHA:** 04/06/2019  
**C.M.P.A.M.:**  **IMPORTE:** \$ 2,152,190.87 **FECHA:**

**FIANZA CUMPLIMIENTO N°:** 3825-02435-0 **IMPORTE:** \$ 215,219.09 **FECHA:** 04/06/2019  
**FIANZA ANTICIPO N°:** No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

### DATOS DE LA OBRA

**DESCRIPCIÓN:** AS231.- CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA,

**LOCALIDAD:** EN LA CIUDAD DE BALANCAN DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. DOMÍNGUEZ,

**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 07/06/2019 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 05/08/2019  
**FECHA REAL DE INICIO:** 07/06/2019 **FECHA REAL DE TERMINO:** 30/10/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>07/06/2019 AL 30/06/2019</u>	<u>\$ 470,398.00</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/07/2019 AL 31/07/2019</u>	<u>\$ 782,034.03</u>
<u>03 (C.A.)</u>	<u>01/07/2019 AL 31/07/2019</u>	<u>\$ 115,941.13</u>
<u>04 (C.N.P.C.O.)</u>	<u>01/10/2019 AL 05/10/2019</u>	<u>\$ 656,149.78</u>
<u>05 (C.N.P.C.O.) Final</u>	<u>06/10/2019 AL 30/10/2019</u>	<u>\$ 127,666.76</u>
<b>IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:</b>		<b>\$ 2,152,189.70</b>

**INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:** \_\_\_\_\_

**TOTAL RECURSOS EJERCIDOS:** \$ 2,152,189.70

**CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_

**CARGOS AL CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_

**CANCELACIÓN DE SALDOS:** \$ 1.17

## ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

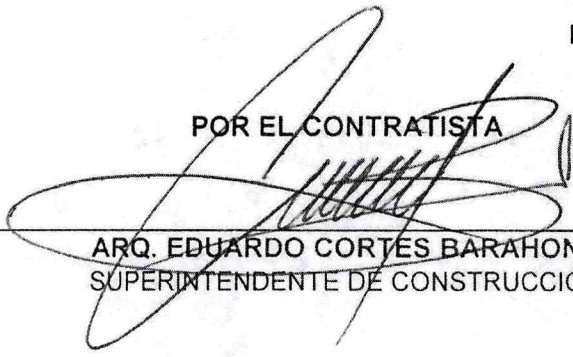
UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.


FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

### REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA

  
ARQ. EDUARDO CORTÉS BARAHONA  
SÚPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA

  
ING. WILLIAMS AVALOS JIMÉNEZ  
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS
