

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2022	

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 07-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Conto de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador								
				Clave de INEGI (9 Dignos)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1/2022U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERÁ LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	2022	31/12/2022	1,134,006.31	472,540.43	0.00	0.00	472,540.43	472,540.43	661,465.88	661,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
2/2022U270	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO VTRIFICADO, ARREGLO MECÁNICO, CLORACIÓN, DOSIFICACIÓN, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELÉCTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA ETAPA, DE 2)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	2022	31/12/2022	190,084,724.85	190,084,724.85	20,238,420.00	20,238,420.00	190,084,724.85	190,084,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0
3/2022U2711	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD, PERNADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	2022	31/12/2022	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1
4/2022U2712	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 10.815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	2022	31/12/2022	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10.815	10.815

*[Handwritten signatures and initials]*

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 2 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:	
DÍA	MES
31	DIC
2022	AÑO

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador														
				Clave de INEGI (9) Dignos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada											
5/2022U273	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 10.815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/12/2022	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	Autorizado	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10.815	10.815							
														Licitado	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														Contratado	<b>20,818,918.15</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
6/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA SURESTE), EN 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/12/2022	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	Autorizado	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1							
														Licitado	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														Contratado	<b>1,208,735.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
7/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA NOROESTE), EN 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/12/2022	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	Autorizado	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1							
														Licitado	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														Contratado	<b>1,219,206.66</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
8/2022U276	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERÁ 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/12/2022	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	Autorizado	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1							
														Licitado	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
														Contratado	<b>1,941,555.41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													



ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador								
				Clave de INECI (9 Dignos)	Municipio			Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Gu.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
9/2022U277	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROESTE, QUE ABASTECERA 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	2022	31/12/2022	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
10/2022U276	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	2022	31/12/2022	3,784,443.75	1,844,159.44	0.00	0.00	3,784,443.75	1,844,159.44	1,940,284.31	1,940,284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0	
11/2022U277	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO) EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA DE 2 ETAPAS)	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	2022	31/12/2022	3,860,207.61	1,881,079.17	0.00	0.00	3,860,207.61	1,881,079.17	1,979,128.44	1,979,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0
12/2022U278	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	2022	31/12/2022	883,960.00	441,980.00	0.00	0.00	883,960.00	441,980.00	441,980.00	441,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
13/2022U2729	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CAPTACIÓN, DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES, MEXIQUITO, NUEVO MADERO, BUENA VISTA IRA SECCIÓN Y OXOLÓTÁN DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	TACOTALPA	BUENAVISTA IRA SECCIÓN, OXOLÓTÁN, MEXIQUITO, NUEVO MADERO	2022	31/12/2022	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0

*[Handwritten signatures and initials]*



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**LOCALIDADES URBANAS**  
**REPORTE DE AVANCE 2022**  
**(PESOS)**



HOJA 4 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:  
 DÍA 31 MES DIC AÑO 2022

ESTADO: TABASCO  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022  
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador															
				Clave de INECI (9 Dígitos)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada													
14/2022U2730	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 28,931 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 8" (6,728 ML) Y 12" (12,600 ML) DE DIÁMETRO, Y DE PVC DE 4" (3,900 ML) Y 6" (5,703 ML) DE DIÁMETRO, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS). DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	3/12/2022	61,220,733.04	61,220,733.04	0.00	0.00	61,220,733.04	61,220,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									28,93	0		
15/2022U2731	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SCRUBBER, TIPO MANUAL-AUTOMÁTICO, PARA EMERGENCIA DE VAPOR DE CLORO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	3/12/2022	8,621,313.95	8,621,313.95	0.00	0.00	8,621,313.95	8,621,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										1	0
16/2022U2732	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA, CASETA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, ARREGLO ELECTROMECAÁNICO, LÍNEA DE AGUA CRUDA E INTERCONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN TEPETITÁN, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	MACUSPANA	TEPETITÁN	IT	2022	3/12/2022	10,155,107.56	10,155,107.56	0.00	0.00	10,155,107.56	10,155,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										1	0
17/2022U2733	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 5 PLANTAS POTABILIZADORAS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SURESTE, EN LAS LOCALIDADES CARMEN SERDÁN (3 LPS), EL CONGO (8 LPS), LA ISLA IRA SECCIÓN (2 LPS), LA ISLA 2DA SECCIÓN (1 LPS) Y CHIQUIHUITE (1 LPS) DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	CARMEN SERDÁN, EL CONGO, LA ISLA IRA, SECCIÓN, LA ISLA 2DA SECCIÓN, CHIQUIHUITE	IT	2022	3/12/2022	10,398,855.36	10,398,855.36	0.00	0.00	10,398,855.36	10,398,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										1	0

*(Handwritten signature and initials)*

ESTADO: TABASCO

HOJA 5 DE 7

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador						
				Clave de INECI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
18/2022U273	CEAS	AGUA POTABLE	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (PERA ETAPA)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/12/2022	28,794,822.10	14,138,257.65	0.00	0.00	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	1	1
19/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (PERA DE 3 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/12/2022	14,046,323.81	6,853,201.39	0.00	0.00	14,046,323.81	6,853,201.39	7,193,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	1
20/2022U2734	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2,437 M DE TUBERÍA DE PVC 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DEL TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD A LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120001	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/12/2022	23,293,599.75	23,293,599.75	0.00	0.00	23,293,599.75	23,293,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,437	0
21/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOS A	IT	2022	31/12/2022	580,000.02	290,000.01	500,000.00	250,000.00	580,000.02	290,000.01	290,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	7	7
<b>TOTAL</b>										452,212,388.60	424,149,843.09	20,758,420.00	20,488,420.00	452,212,388.60	424,149,843.09	28,062,545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
ARQ. ARMANDO PABALLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 6 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
				Municipio	Localidad				Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpai.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	3/12/2022	680,522.98	340,261.49	0.00	680,522.98	340,261.49	340,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	NACAJUCA	EJIDO EL CEDRO	IT	2022	3/12/2022	1,107,800.14	553,900.07	0.00	1,107,800.14	553,900.07	553,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	NACAJUCA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	3/12/2022	539,972.43	180,026.81	0.00	539,972.43	180,026.81	180,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	3/12/2022	743,345.25	278,754.47	0.00	743,345.25	278,754.47	278,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

TOTAL	3,071,640.80	1,352,942.84	0.00	0.00	3,071,640.80	1,352,942.84	1,718,697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,640.80	1,352,942.84	1,718,697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CONTRALORIA SOCIAL


Autorizado	2,612,411.74	1,306,205.87	0.00	0.00	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,612,411.74	1,306,205.87	0.00	0.00	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	884,220.11	444,435.06	0.00	0.00	884,220.11	444,435.06	439,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	884,220.11	444,435.06	439,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	884,220.11	444,435.06	0.00	0.00	884,220.11	444,435.06	439,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	884,220.11	444,435.06	439,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN CEAS

Autorizado	2,103,726.00	1,051,863.00	0.00	0.00	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,103,726.00	1,051,863.00	0.00	0.00	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	1,444,995.08	722,222.54	0.00	0.00	1,444,995.08	722,222.54	722,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,995.08	722,222.54	722,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	1,444,995.08	722,222.54	0.00	0.00	1,444,995.08	722,222.54	722,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,995.08	722,222.54	722,222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA ACCIONES MACUSPANA

Autorizado	4,217,960.00	2,108,980.00	0.00	0.00	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	4,217,960.00	2,108,980.00	0.00	0.00	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	4,204,126.01	2,102,063.00	0.00	0.00	4,204,126.01	2,102,063.00	2,102,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204,126.01	2,102,063.00	2,102,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	2,942,888.21	1,471,444.10	0.00	0.00	2,942,888.21	1,471,444.10	1,471,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942,888.21	1,471,444.10	1,471,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	2,669,620.02	1,334,810.01	0.00	0.00	2,669,620.02	1,334,810.01	1,334,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,620.02	1,334,810.01	1,334,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

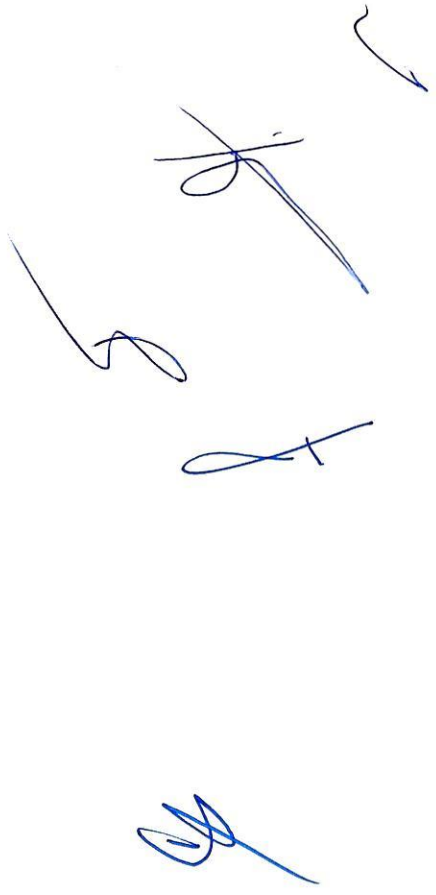

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


HOJA 7 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2022	

ID ACCIÓN (SISEA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Clave de INECI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador		
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada

TOTAL PROGUA 2022																
Autorizado	464,218,127.14	429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	464,218,127.14	429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	462,114,810.63	427,993,228.24	34,121,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	277,352,481.11	249,640,580.13	27,711,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	269,999,724.25	242,788,557.12	27,211,167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

